

DE INSTALLATIE IS NIET CONFORM

Datum(s) van controle: 28/09/2021 **Uitgiftedatum verslag:** 28/09/2021
Verslagnummer: 0371-210928-04

Identificatie van het erkend organisme en de agent-bezoeker:

Naam: Technisch Bureau Verbruggen
 Adres: Neerveldstraat 109 bus 6, 1200 Brussel
 T: 056 70 54 05 E: btv.westvlaanderen@btvcontrol.be Ondernemingsnummer: 0406.486.616
 De agent-bezoeker: nummer 0371

Identificatie van derden:

Opdrachtgever: GEMEENTEBESTUUR AVELGEM
 Adres: KORTRIJKSTRAAT 8, 8580 AVELGEM
 Naam eigenaar, uitbater of beheerder: STATIONSGEBOUW
 Adres: YZERWEGSTRAAT 2, 8580 AVELGEM
 Verantwoordelijke voor de uitvoering van het werk: GEMEENTEBESTUUR AVELGEM
 Adres: KORTRIJKSTRAAT 8,8580 AVELGEM
 BTW-nummer: 0207485770

Identificatie van de elektrische installatie:

Naam: STATIONSGEBOUW
 Adres: YZERWEGSTRAAT 2, 8580 AVELGEM
 EAN- code:
 Nummer teller: 16094052
 Private hoogspanningscabine: Nee
 Type installatie: tekenacademie

Gegevens van de controle:

Type controle volgens Boek 1 - KB 08/09/2019: Controlebezoek (6.5), Eerste controle volgens bijlage III.2-1 van boek III van de codex over het welzijn op het werk
 Datum uitvoering van de installatie: Vóór 01/10/1981, Vanaf 01/10/1981 tot 01/06/2020

Informatie inhoud controle: Geen

Afwijking(en) deel 8 Boek 1 - KB 08/09/2019: toegepast
 Ander(e) wettelijk(e) kader(s): n.v.t.

RE06_02-08_01-15 09/20

Verslagnummer 0371-210928-04



Gegevens van de elektrische installatie:

Spanning en aard van de stroom: 3 x 230V

Voedingsleiding hoofdbord: Type: VOB - Doorsnede: 3x16 mm²

Type aardelektrode: Aardingspen

Aantal borden: 2

Nominale waarde bescherming aansluiting: 40A

Type algemene schakelaar: 4P 40A/300mA


Type aardverbindingssysteem: TT

Aantal stroombanen: 11+7 (reserve inbegrepen)

BESCHRIJVING:

Zie ééndraadsschema's en situatieplannen

Geplaatste differentieelstroominrichtingen: 4P 40 A 30 mA type A, beschermde stroombanen: Zie schema's

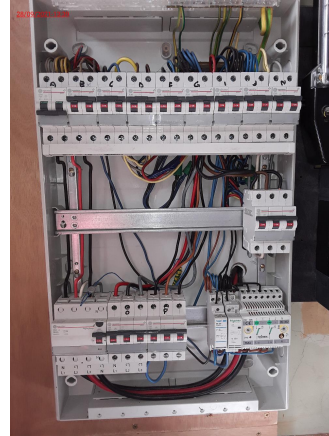

Document met uitwendige invloeden: Zie lijst in bijlage ref. Yzerwegstraat 2, 8580 Avelgem

Ref. lijst evacuatiewegen en moeilijk evacueerbare ruimten: n.v.t.

Documenten van de veiligheidsinstallaties: Geen meegedeeld

Documenten van de kritische installaties: Geen meegedeeld

Situatieplan van de aardverbindingen: n.v.t.

Ref. verslag gelijkvormigheidscontrole: n.v.t.

Plaatsaanduiding ondergrondse leidingen: n.v.t.

Andere gegevens: n.v.t.

Resultaten van de controle:

Metingen en beproevingen:

Spreidingsweerstand van de aardverbinding: 30 Ohm Waarde van de algemene isolatieweerstand: >0,50 MOhm

Vastgestelde inbreuken:

- 1 Het volgnummer is niet op elk bord vermeld in een niet-huishoudelijke installatie (Boek 1: 3.1.3.3).
- 2 Het aardverbindingssysteem is niet op elk bord vermeld in een niet-huishoudelijke installatie (Boek 1: 3.1.3.3).
- 3 De te verwachten maximale kortsluitstroom ter hoogte van het bord is niet op elk bord vermeld in een niet-huishoudelijke installatie (Boek 1: 3.1.3.3).
- 4 Het gebruik van een groene of gele geleider met een sectie groter dan of gelijk aan 1,5 mm² als actieve geleider is niet toegestaan (Boek 1: 5.1.6.2).
- 5 De contactdozen bezitten geen aangesloten aardingscontact (Boek 1: 4.2.2.3/5.3.5.2).
- 6 De interne soepele geleiders zijn niet aan beide uiteinden voorzien van samenknijpende hulzen of evenwaardig (Boek 1: 5.3.5.5).
- 7 De voedingsspanning is niet op elk bord vermeld (Boek 1: 3.1.3.3).
- 8 De in bundel/laag geïnstalleerde geïsoleerde geleiders en kabels hebben niet ten minste het kenmerk F2 of ten minste de klasse Cca (Boek 1: 5.2.7.3).
- 9 De situatieplannen stroken niet met de werkelijkheid (Boek 1: 3.1.2.1).
- 10 De hoofdequipotentiale verbindingen ontbreken (Boek 1: 4.2.3.2).

RE06_02-08_01-15 09/20

Verslagnummer 0371-210928-04



Opmerkingen:

Geen

Besluit van de controle:

3. De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van Boek 1, van het koninklijk besluit van 8 september 2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie.

De werken, nodig om de tijdens het controlebezoek vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, moeten zonder vertraging worden uitgevoerd en alle gepaste maatregelen worden genomen opdat, indien de installatie in dienst blijft, deze inbreuken geen gevaar vormen voor de personen of goederen.

Tijdstip van afwerking:

agent-bezoeker 0371 i.o. van de technisch directeur
28/09/21 14:12

De technisch directeur, ir. Bart van Rossum

